

**‘Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību’  
(2010/0181/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051)**

***Par Decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem.***

Būvprojekts par Dienesta viesnīcas rekonstrukcijas darbiem ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē pa daļām līdz 21.11.2011.

Ir uzsākti arī sekojoši demontāžas darbi:

- ) Lietus ūdens kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek demontēta vecā lietus ūdens čuguna kanalizācijas sistēma.
- ) Aukstā un karstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek veikta veco tērauda cauruļvadu sistēmas demontāžas darbi ieskaitot visu iekārtu (izlietņu, klozetpodu, dušas vannu, jaucējkrānu) noņemšanu.
- ) Grīdas segumu un pamatņu demontāža. Tiek demontēta grīda (linolejs, lamināts, paklāju segumi), kā arī to sagataves.
- ) Iebūvējamo mēbeļu demontāža. Tiek izlauzti iebūvējamie skapji, plauktu sistēmas.
- ) Starpsienu (mūra) demontāžas darbi. Tiek demontētas starpsienas saskaņā ar jauno plānojumu. Kā arī jauno aiļu un atvērumu veidošanu.

Izpildīto darbu kopapjoms 50%.

Uzsākti sekojošie būvdarbi:

- ) Sienu un griestu apdare. Tiek veikti virsmu sagatavošana krāsošanai (špahtelēšana, daļēja apmetuma atjaunošana), krāsošana, tapešu līmēšana un krāsošana.
- ) Grīdu apdare. Tiek veikta grīdu pamatņu sagatavošana, tas ir izlīdzinošās ģipša grīdas ieliešanas, slīpēšanas, špahtelēšanas darbi, kā arī linoleja ieklāšanas darbi (ieskaitot grīdlīstu montāžu).
- ) Flīzēšanas darbi. Tiek veikti flīzēšanas darbi dušas un WC telpās, gan sienām, gan grīdām.
- ) Durvju montāžas darbi. Ir uzsākta durvju montāža.

Izpildīto darbu kopapjoms 20%.

Uzsākti sekojošie inženierkomunikāciju darbi:

- ) Lietus ūdens kanalizācijas montāžas darbi. Tiek izbūvēta jauna sistēma.
- ) Aukstā un karstā ūdensvada montāža. Tiek izbūvēta jaunā tērauda cauruļvadu sistēma.
- ) Sadzīves kanalizācijas sistēma. Tiek izbūvēta jauna PV cauruļvadu sistēma.
- ) Apkures sistēma. Tiek izbūvēta jauna tērauda un vara cauruļvadu sistēma ar jauno radiatoru montāžu.

Izpildīto darbu kopapjoms ap 40%.

## FOTO REPORTĀŽA

Apkures, ūdensvada demontāža, jaunās sistēmas montāža



Kanalizācijas sistēmas montāža




Sienu, grīdu pamatņu, apkures sistēmas demontāža





Jauno cauruļvadu montāža, sienu apšuvums

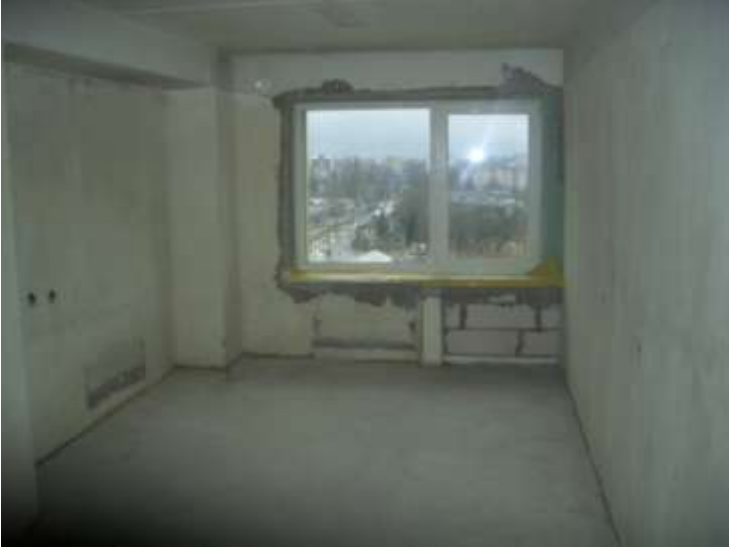

Jauno, remontēto istabiņu skats



